


## Souhrnné vyhodnocení investičních akcí a oprav 2017

### **OBSAH:**

1. Úvod
2. Hodnocené období
3. Finanční rámec
4. Příprava realizace investičních akcí
5. Souhrnný předmět investičních akcí
6. Rozsah investičních akcí
7. Závěr
8. Dokladová část

V Chomutově dne 16. 4. 2018

Zpracoval: Odbor rozvoje a investic

.....  
  
Ing. Jitka Surkalová  
Finanční manažer  
rozvoje a investic

## 1.) Úvod

Odbor rozvoje a investic je od roku 2017 rozšířen a rozdělen do tří úseků. Jedná se o stávající úsek Územního plánování, úsek Rozvoje investic města a nově o úsek Dotací a strategického plánování města. V náplni všech úseků tvořící jeden odbor statutárního města Chomutova je každoročně zpracován základní rámec investičních, neinvestičních a dotačních akcí realizovaných statutárním městem Chomutovem nejen v roce 2017. Objemově větší investiční a dotační akce volně probíhají do dalších let.

Rozsah a náplň připravovaných akcí vychází z aktuálních potřeb statutárního města Chomutova, všechny akce jsou předem projednány v příslušných výborech (investiční, finanční) a po té postoupeny k projednání v orgánech města Chomutova. Náplň investičních akcí je průběžně a letitě tvořena z dlouhodobé databáze investičních akcí, na základě podnětů organizací zřízených městem, od občanů. Mnohé akce jsou tvořeny nárazově, operativně, havarijně, tak jak vyžaduje situace.

## 2.) Hodnocené období

Hodnoceným obdobím se rozumí období realizace akcí od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. V níže uvedené tabulce přehledů projektů je uvede i stručný popis akcí včetně dodavatelů podílejících se na akcích a nákladů akcí v daném roce. V mnohých případech akce přechází do následujícího roku, nebo se naopak dokončují z předchozího roku.

## 3.) Finanční rámec

Je dán reálnými ekonomickými možnostmi statutárního města Chomutova v daném plánovaném období a je tvořen schválenými finančními prostředky města v rozpočtu města na rok 2017 (investiční prostředky rozpočtu, kapitálové příjmy, rezerva).

Pro rok 2017 byly plánovány investiční akce kapitoly 03 rozpočtu města v celkové objemové výši 310.804.000,- Kč, skutečné čerpání v roce 2017 dosáhlo částky 219.035.945,- Kč, to je 70,47 % z celkového objemu rozpočtu odboru.

Tabulka představuje výtah čerpání z fondů města, investic na školská zařízení a ostatních investic.

Tabulka: výtah čerpání orj. 03 z celkového objemu rozpočtu ORJ:

<b>Rozpočet orj. 03 2017 310.804.000,- Kč z toho:</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpání v Kč</b>
FRMK (Fond rozvoje místních komunikací) celkem	72 530 000,00	57 731 786,65
FRDI (fond rozvoje dopravní infrastruktury) celkem	11 380 000,00	2 906 642,56
Ostatné investice celkem	94 510 000,00	61 049 480,65
Investice - Školská zařízení	31 477 000,00	30 471 531,57

#### 4.) Příprava realizace investičních akcí

Příprava jednotlivých investičních akcí byla zajišťována v plném rozsahu Odborem rozvoje a investic, tj. předprojektová a projektová příprava, vydání potřebných správních rozhodnutí dle platných zákonných norem, zadávání veřejných zakázek a následná realizace, včetně uzavírání smluv o dílo a následné uvedení do provozu, zajišťované ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými statutárním městem Chomutov. Příprava a zahájení investičních akcí je závislá na časovém schválení rozsahu a na finančním krytí.

#### 5.) Souhrnný předmět investičních akcí

Souhrnně lze charakterizovat investiční akce roku 2017 jako program směřující k zlepšení života ve městě s odkazem na životní prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu, bydlení, sport a kulturu. Cílem realizací investičních akcí je dosáhnout maximálního výsledku jak z hlediska nově vybudovaných akcí, ale i oprav historických památek města. Nově začal být realizován tzv. participativní rozpočet, jehož základní podstatou je příjem námětů od občanů k vylepšení bydlení v Chomutově. Každoročně město vyčleňuje prostředky ve výši 5.000.000,- Kč, které jsou využity na základě hlasování občanů města na samostatných webových stránkách <http://www.naschomutov.cz/>. V tabulce přehledu projektů jsou jednotlivé nápady stručně charakterizovány. Součástí rozvoje města je i zpracování důležitých strategických dokumentů, koncepcí, studií a architektonických soutěží. Stěžejní koncepcí pro rok 2017 – 2018 se stává koncepce rozvoje Kamencového jezera, které město převzalo do správy (pod PZOO), v návaznosti na demolici hotelu u jezera, úpravy zóny a celkového prostředí Kamencového jezera.

#### 6.) Rozsah investičních akcí

Celkem bylo orgány města schváleno na kapitole 03 - 71 akcí včetně fondů a obnově historických památek a investic do školských zařízení, v níže uvedené tabulce jsou akce souhrnně popsány. V souvislosti s přípravou jednotlivých investičních akcí je do rozpočtu zahrnuta a čerpána organizace (název akce) tzv. **Příprava projektů**. V přípravných fázích projektu tato souhrnná organizace slouží jako zdroj finančních příjmů k přípravě akcí (studie, poradenství, PD, zaměření ...), postupně v průběhu roku ve fázi začátku realizace akce jsou přípravné náklady rozpuštěny do jednotlivých samostatně označených organizací (akcí).

Přehled ostatních akcí ORI týkající se projektů města je uveden samostatně v Přehledu projektů 2017.

# Investiční akce za rok 2017

		2017		
pořadové číslo akce	název akce	popis investiční akce	dodavatelé podílející se na akci	náklady akce v Kč
		<b>Investiční akce</b>		
1	Veřejné osvětlení města	V rámci investice VO došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení, bylo provedeno rozšíření VO ul. Jasminová, v Alejích Rekonstrukce rozvaděče veřejného osvětlení na p. č. 1217 v ul. Akademika Heyrovského. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Rooseveltova ul. čp. 2850, Chomutov – stožáry, svítidla včetně kabeláže Rekonstrukce veřejného osvětlení v PZOÚ včetně příprav tj. PD, Rekonstrukce 1 ks světelného místa (za ZHMD) v ul. Čelakovského. Zhotovení PD veřejného osvětlení u infocentra v Chomutově, Aktualizace PD VO Palackého x Riegrova.	Václav Šedivý, Chomutov AMP Chomutov a.s., Chomutov SATHEA VISION s.r.o., Praha ELPRO Chomutov s.r.o., Chomutov 3	196 218 91 155 2 846 067 27 830
2	Dětské hřiště	V rámci investiční akce dětské hřiště byla uzavřena smlouva o dílo na doplnění herních prvků v areálu Domovinka včetně úpravy povrchů, dopravy štrků	Hlavní dodavatel - hřiště.cz, s.r.o., Brno, ostatní dodavatelé - Vladimír Šeiner, Otvice, Akama, Bagros	941 845
3	Budovy a majetek SMCH	V rámci investiční akce byla provedena hlavní výstavba, rekonstrukce vstupu do objektu budovy Technických služeb města Chomutova z náměstí 1. máje. Včetně vybavení vstupní místnost (pult, křesla, lavice, elektronický vrták, návrhy, osvětlení návrh loga, logo, malování...) V rámci akce byla provedena tavební úpravy zasedací místnosti v objektu MMCh, Zborovská, včetně vybavení technikou a zařízením (část byla hrazena z projektu Otevřené a moderní úřady)	Hlavní dodavatel rekonstrukce - WALD S s.r.o., Kadaň, Ostatní - Elpro, Alax, Elply, Slavík, AZ-reklama, KZ systém, Riva, Jasný, Nonac, TSMCH Hlavní dodavatel - ABC Chomutov spol. s r.o., Chomutov, ostatní - Staněk, AV MEDIA	1 497 951 2 445 000
4	Mobilifič města	V rámci pořízení mobilifiče města byly přizvány lavičky Borola v počtu 21 ks, koše Borola v počtu 20 ks, do areálu Kamencového jezera	BLACKBOX s.r.o., Třebíč	433 550
5	Kamencové jezero	Cílem investiční akce, je celková rekonstrukce (výměna) hlavního mola a vedlejších mol a bazénků. V rámci akce došlo k odstranění původních pilot a následně došlo k vytvoření kompletu hlavního pátevního mola včetně věžičky plavčíka, schodiště, ktení aj., dále ke stavební části č. 2 tvorba sportovního zázemí, bazénů a bočnicích mol. Součástí celé akce je zajištění technického a autorského dozoru, BOZP, geologického posouzení. Nové do areálu byla instalována dvoukřídla elektronická brána, byly dodány ostatní materiály k bazénkům, brouzdalištím, dřevu, štrčkům, byla nakoupena umělá tráva, byly provedeny ostatní stavební úpravy okolí mola a bazénků, v rámci akce došlo i k monitoringu, snímkování a revizi mol	Hlavní dodavatel stavby - MP CZ, a.s., Praha. Piloty odstranění - potápěčská stanice, ostatní dodavatelé - Rocknet, Sinnet EU, Větrovský, Ideafactory, Macík, Ochrana pozemních vod, V.O.S. INKOD a jiné	38 191 673
6	Kulisárna divadlo - investice (elektroinstalace, odhluchnění, VVC)	investiční akce je zaměřena na rekonstrukci elektroinstalace, odhluchnění a rekonstrukci sociálního zařízení. Součástí nákladů akce je i vyhotovení projektové dokumentace	Readysan Chomutov, PD- ing. Alena Kůrková, Cv	1 287 762
7	Letní kino - rekonstrukce WC	v rámci akce došlo k provedení rekonstrukce kanalizace a sociálního zařízení v areálu Letního kina, včetně příprav jakop je PD, zpracování statického posouzení. V areálu bylo nově instalováno záchodů k toaletám.	hlavní dodavatel stavby - L. A. Interiér s. r. o., Chomutov, Ostatní - Sings, O.K. Projekt, Fanak	772 574
8	Obnova historických památek	V rámci obnovy historických památek došlo k obnově ničené vázy z pilíře zábradlí mostu přes Chomutovku v Chelčického ulici v Chomutově, k opravě zničené vázy z pilíře zábradlí mostu přes Chomutovku v Chelčického ulici v Chomutově, k opravě na objektu a okolí čp. 86 opravy obrubníků, doplnění kačířku, nátěry mříží na jižním průčelí a opravy soklu věže. Dále pak došlo k Vyčistění prostoru krovu městské věže v Chomutově na nám. 1. máje a revizi a opravě poškozené části pultové střechy - TsmCh. <b>Finanční prostředky vynaložené na obnovu historických památek jsou vedeny jako opravy.</b>	ARCHIKASO spol. s r.o., Kamenice, PEXTRA stavební spol. s r.o., Chomutov, Miroslav Háek, Chomutov	229 814
9	Vinohradská kaple	V rámci akce byla opravena Vinohradská kaple na p.p.č. 1760 Chomutov I.	ARCHIKASO spol. s r.o., Kamenice	307 769
10	Dům č.p. 38-Mánesova (zadní vchod ČVUT)	V rámci akce byla opravena fasáda č.p. 38 ul. Mánesova, CV. Dům č.38	PEXTRA stavební spol. s r.o., Chomutov	372 653
11	Radnice - izolace vnitřního dvorečku	v rámci akce byla provedena oprava dlažby dvora radnice č.p. 1 - lapidárium oblastního muzea v CV a stěn vnitřního dvorečku radnice čp. 1 sřárování a oprava zdva komínů.	PEXTRA stavební spol. s r.o., Chomutov	433 894
12	Dům č.p.104 - husovo náměstí (stavební úřad)	Kamenické práce na vstupním sloupovém portiku s balkonem budovy čp. 104 na Husově náměstí	ARCHIKASO spol. s r.o., Kamenice	518 729
13	Oprava fasády - oblastní muzeum	V rámci akce byla provedena Oprava jižní fasády čp. 86 Palackého ul. Chomutov Muzeum	PEXTRA stavební spol. s r.o., Chomutov	1 141 692
14	Socha svatě Barbory PZOÚ	V rámci akce došlo k celkovému restaurování sochy sv. Barbory u statku PZOÚ Chomutov	ARCHIKASO spol. s r.o., Kamenice	332 766
15	Výklenková kaple - Zadní Vinohrady	Oprava výklenkové kaple na Zadních Vinohradech v Chomutově	MgA. Jakub Orava, DiS., Odry	327 000
16	Rekonstrukce/oprava kanalizace	V rámci investiční akce došlo k rekonstrukci potrubí z Podkráňšohorského přivaděče do Filipových rybníků, CV.	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O., Chomutov	166 485
17	Participativní rozpočet (PB)	Z finančních prostředků celkového objemu 5. miliónu korun se podařilo připravit část akci z celkových 13 ti vybraných projektů, kterými nově občané tvoří a upravují Chomutov.		1 525 842
18	PB - Oprava psiho útulku	Předpokládané náklady akce jsou 600 000,- Kč v rámci opravy došlo k opravě čtyř kotců, ostatní se dokončí v roce 2018. Podařilo se rekonstruovat betonové podlahy a zdi, vše se očistilo od plísní a natřelo penetrací. Do výšky 0,5 m mají zdi omyvatelný venkovní nátěr, aby se kotce mohly bez problému vymýt vodou z hadice a neohrozilo vniknutí vlhkosti do zdí.	ZKZ Chomutov s. r. o., Chomutov	416 459
19	PB - Bezručovo údolí – zábavné na l. Mlýn	Předpokládané náklady akce jsou 600 000,- Kč. Cílem projektu je zpestit cestu Bezručovo údolím. Nynější pěší a cyklistická cesta na první mlýn je dlouhá necelé 4 km, cílem je i tyto 4 km využít k odpočinku a relaxaci. Navrhli jsme podél trasy 5 stánovišť, které by mohly využít všichni od dětí až po seniory. Na každém stánovišti vytvoříme hrací prvek pro děti, cvičební prvek pro dospělé a lavička na běžné odpočinku. Tyto stánoviště by určité dětem zpestřily dlouhou cestu na první mlýn a všem ostatním by pomohla si trochu zacvičit a protáhnout tělo.	projekt bude realizován v roce 2018	x
20	PB - Bezručovo údolí – lesní cestou na l. mlýn bezpečně	V rámci projektu dojde k opravě lesní cesty, včetně opravy stávajících dřevěných lávek a vytvoření nové.	V.O.S. INKOD CV a Josef Macík, Dřínovská Chomutov	351 000
21	PB - Upravení okolí fontány v městském parku	V rámci projektu došlo k umístění několika odpadkových košů, úprava posezení, revitalizace záhonků v okolí fontány v městském parku, současné k doplnění šachovnice včetně šachových figur, pořízení nových stolečků	KAPPA, TBG, Reif, Stoa, Janáková, TSMCH	106 215
22	PB - Spojka cyklostezky a cyklotrasy mezi Bandou a Kamencovým jezerem	V rámci projektu došlo k úpravě napojení cyklostezky mezi Bandou a Kamencovým jezerem.	TSMCH	43 802
23	PB - Rozkvetlý městský park a Obnova květinových hodin	cílem projektu bylo zrušit „zvyšený betonový záhon“ a místo něj zasadit do prostoru jeden strom a kolem něj umístit kulatou lavičku obepínající kmen stromu či osadit lavičky po obvodu vzniklého náměstí. Tim vznikne místo setkání i odpočinku a také reprezentativní vstup do parku. Okolí tohoto nově vzniklého místa by mělo být osázeno záhony s trvalkovou výsadbou kvetoucí od jara do podzimu. vzhledem k umístění sítí napruje architekt i projektant umístit při vstupu květinové hodiny. Předpokládaná cena akce 400 000,- Kč	projekt bude realizován v roce 2018	x
24	PB - Oprava obvodové zdi hřbitova v Beethovenově ulici	V rámci akce došlo k opravě zdi u hřbitova.	L. A. Interiér s. r. o., Chomutov	153 057
25	PB - Bike areál dokončovací práce	Areál se nachází přímo u cyklostezky, bude vybudován z přírodních materiálů jako je hlína, kámen a písek. Areál bude volně přístupný veřejnosti, pro každého, kdo má zájem na kole naučit něco navíc. Vše bude navrženo tak, aby ho mohli využívat děti od 5 let, a bude vytvořen tak, aby byl sjízdný a lehce zvládnutelný na jakémkoli typu kola jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. V areálu budujeme dvě sportoviště: 2 pumptracky a bikrosovou dráhu. Předpokládané náklady akce 370 000,- Kč akce bude dokončena v roce	Stakado s. r. o., Údlice	136 000
26	PB - Přestupák a taky park	Cílem projektu je vytvořit kvalitní odpočinkovou zónu pro čekající na autobus a přiblížit pohled na řeku na zastávce Palackého. V místě teče řeka hlubokým korytem. Nad ní stojí lidé čekající na autobus. Mezi řekou a lidmi jsou čtyři druhy zábradlí, stíhané plochy kerů a schody k vodě. Navrhujeme, aby se místo proměnilo na skutečnou odpočinkovou zónu a příjemné místo k čekání na autobus či trolejbus. Předpokládané náklady akce cca 600 000,- Kč.	projekt bude realizován v roce 2018	x
27	PB - Venkovní posilovací stroje na Domovince	Cílem projektu bylo umístit do areálu Domovinka venkovní posilovací stroje – workout (cvičení s vahou vlastního těla) i fitpark (posilovací stroje). Předpokládané náklady akce cca 600 000,- Kč.	projekt bude realizován v roce 2018	x
28	PB - Zábradlí pro bezpečí dětí na lávce přes přivaděč v Děvinské ulici	Cílem projektu bylo opravit zábradlí, tak aby bylo bezpečné i pro nejmenší děti	BC. Kamila Kučerová	26 300
29	PB - Úprava sjezdu z Přemyslovy ul. na cyklotrasu 3077	V rámci akce došlo k ubourání původní zdičky, vystavení nové a úpravě vjezdu na cyklostezku	ZKZ Chomutov s. r. o., Chomutov, Mrázek F.	147 735
30	Park ČSA	V rámci investiční akce dojde k úpravě plochy rozána v městském parku, dojde k rekonstrukci přilehlého altánu, ploch a záhonů včetně osvětlení. Součástí investice je i autorský a technický dozor, statické posouzení zálohový systém. Akce přechází do roku 2018.	Hlavní dodavatel - KHL - EKO, a.s., ostatní - TSMCH, atelier 6 senses s.r.o, Bohemia Green, O.K. Projekt	4 710 191
31	Kontejnerová stání	v rámci akce bylo zřízeno nové kontejnerové stání v ulici Na Průhoně a v ul. Šafaříkova	MALTOP - EKO s.r.o., Místo, Švadlenka Radek, Chomutov	383 585
32	Budova hlavního hřbitova - bezbarierový přístup	V rámci akce zatím došloke zpracování PD,Bezbarierový vstup do smuteční obřadní síně, Beethovenova 564, Chomutov. Akce bude dokončena společně s akci rekonstrukce smuteční síně hřbitov ve 2018.	Hana Möbiusová, Chomutov	10 500
33	Přístřešky pro kontejnery venkovní plocha ZS	V rámci akce došlo k dodávce a montáži 4 kusů kontejnerového zastřešení v ul. Mostecká (zimní stadion).	MALTOP - EKO s.r.o., Místo	238 433
34	Výměna oken - budova TSMCH č.p. 89 nám. 1. máje	v rámci akce došlo k výměně oken v budově TSMCH.	AA OKNA DVEŘE s.r.o., Praha	663 274

		Investice - Školská zařízení		
35	ZŠ Březenecská	V rámci investiční akce došlo k revitalizaci školního atria, ZŠ Březenecská 4679, Chomutov včetně zaměření, projektové dokumentace a odstranění stávajících ploch	Hlavní dodavatel - READYSAN s.r.o., Chomutov, ostatní - Luňák, atelier 6 sense	2 667 390
36	ZŠ Hornická	v rámci investiční akce došlo k výstavbě víceúčelového hřiště u ZŠ Hornická 4387, Chomutov, včetně příjezdové komunikace, úpravy dopadových povrchů u herních prvků, zpracování PD.	Hlavní dodavatel - VYSSPA Sports Technology s.r.o., Plzeň, ostatní - IQ Projekt, FISAD	3 453 903
37	ZŠ Heyrovského - investice (fasáda)	V rámci investiční akce došlo k zateplení pavilonů A,B,E na základní škole Ak. Heyrovského č.p. 4539, Chomutov, zateplení podhledu, zpracování PD a zajištění AD, TDI a BOZP.	Hlavní dodavatel - VYSKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o., Chomutov, Ostatní - Ing. Trubiroha, IMP Ingineering, SINNET EU	6 115 055
38	ZUŠ - investice (rozšíření výukových prostor, zateplení konc. Sálu)	v rámci investiční akce došlo k zateplení podhledu střešiny na ZUŠ CV, ke stavební úpravě prostor bývalého bytu 2 NP včetně zpracování PD	TRIDENT GROUP 007 s.r.o., Praha, L.A.INTERIÉR s.r.o., Chomutov	1 291 172
39	ZŠ Na Příkopěch - investice (fasáda, dveře) dokončení reko vstup. prostor	V rámci investiční akce došlo k rekonstrukci fasády, úpravě sklepních oken, úpravě střešní krytiny a okapových žlabů a ští střešiny – objektu základní školy Na Příkopěch – dvorní část – dvůr (dle předpokladu se jedná o dotažení uvolněných šablon, zatmělení vstupů a okapových žlabů), dále došlo k provedení nových elektrorozvodů včetně zpracování plánu BOZP.	SWH STAVBY, s.r.o., M. Háek, maltop-eko, Janoščíková	4 122 752
40	ZŠ Zahradní - investice (šatny, panikové dveře)	v rámci akce došlo k opravě podlahových konstrukcí, výměně dlažby v prostoru šaten na ZŠ. Dále došlo k demontáži a nové dodávce šatních skříní a panikových zámků.	READYSAN s.r.o., Chomutov, IN SPACE s.r.o., Praha, A-P.S.K. Technology s.r.o., Litvínov	1 298 433
41	Mateřské školy - investice (hřiště, tabule)	Vybudování multifunkční plochy - areál MŠ Blatenská, CV, vybudování hřiště MŠ Palackého a dodávka herních prvků	4soft, s.r.o., Tanvald, FLORA SERVIS s.r.o., Brno	1 629 136
42	DDM - investice (reko hřiště)	Výstavba víceúčelového hřiště v areálu SVC Domeček	TUBEKO SPORT spol. s r.o., Rynholec	2 398 778
43	Reko školní jídelna Kadaňská	v rámci akce došlo k rekonstrukci školní kuchyně na ZŠ Kadaňská, Chomutov včetně gastrovybavení. V rámci akce probíhal technický dozor. Dále došlo k nainstalování objednávkového a výdejového terminálu pro stravovací systém.	Hlavní dodavatel - Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň, Ostatní - Z-WARE, IMP Ingineering, Konrád, SINNET EU	7 494 914
<b>Investiční akce z Fondu rozvoje místních komunikací</b>				
44	Reko komunikace ul. Šafaříkova a okolí	V rámci investiční akce, která přechází z roku 2017 z I. Etapy volné na II. Etapu došlo ke kompletní rekonstrukci mezi ulicemi Jiráskova - hornická, Šafaříkova-Husova a rekonstrukci a bezpečnostnímu opatření ul. Hornická a část ulice Roosveltova. Kromě základních stavebních úprav dochází v rámci akce ke zpracování PD, geodetickému zaměření, stavbu proáží kontrola TDI a AD, k přeložce vedení sítě elektronických komunikací. Stavba bude dokončena v roce 2018.	Hlavní dodavatel stavby - AMP Chomutov a.s., Ostatní - BZ Tech, SINGS, Latiřák	15 603 009
45	Reko komunikace a chodníku ul. Čelakovského	V rámci investiční akce II. Části (přechod z roku 2016) došlo k rekonstrukci komunikace od vjezdu do městského parku až po křižovatku Čelakovského-Zborovská. Stavební úpravy řešili kompletně frézovací vozovky, vpusť, nové přechody, Vo, parkovací stání. Kromě základních stavebních úprav dochází v rámci akce ke zpracování PD, geodetickému zaměření, stavbu proáží kontrola TDI, AD a koordinaci BOZP.	Hlavní dodavatel stavby - SILNICE TOPOPLANY a.s., Plzeň, ostatní QEMS, MOSEP CV, AMP, FISAD, Kříž, Veselá, Silnice Topolany	8 454 031
46	Reko uličních vpustí a reko povrchů komunikací - koordinace se správci sítí	V rámci investiční akce dochází ke zřízení několika nových uličních vpustí, pokládce trubek, úpravě konstrukcí vrstev vozovek a jiné stavební úpravy, jedná se o ulice Škroupova, Bělohorská, Haškova, Školní, V Alejích, Křížkova, Březenecská, .....	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O., Chomutov, FRK s.r.o., Kadaň, FREIBAU s.r.o., Praha, AMP.	2 488 645
47	Propojení ul. Na Příhonu do ul. Čermáková	V rámci investiční akce došlo k celkové rekonstrukci části ulice Na Příhoně, odvodnění, vybudování nového veřejného osvětlení, doplnění zatravnění, napojení stávajících chodníků, vytvoření osmi nových parkovacích míst, veřejné kontejnerové stání na tříděný odpad. Kromě základních stavebních úprav dochází v rámci akce ke zpracování PD, k přeložce NTL plynovodu PE d 160 v délce 13,5 m a PE d 110 v délce 8,3 m a koordinaci BOZP.	Hlavní dodavatel stavby - PETROM STAVBY, s.r.o. Praha, IQ PROJEKT, SINNET EU, TYGAS, Staněk	3 647 679
48	Reko chodníků ul. Palackého - Riegrova	V rámci investiční akce došlo k bnové povrchů stávajících chodníků, přechodů pro chodce, zeleně a veřejného osvětlení u křižovatky ulic Palackého a Riegrova v CV. V rámci akce došlo ke zpracování PD v rozsahu pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, zpracování rozpočtu. Akce bude dokončena v roce 2018.	TELKONT s.r.o., Teplice 1, SM Projekt Cv	1 603 218
49	Cyklooprava	V rámci investiční akce byla zprovozněna část cyklostezky z Kostelní ulice.	Strabag a.s. Praha	713 185
50	Komunikace a chodníky nám. T.G Masaryka	V rámci investiční akce byla zrekonstruována stávající vozovka, byly vybudovány nové parkovací záclivy, nové uliční vpustí, napojení na kanalizační řád, došlo k výstavbě nového veřejného osvětlení, k vybudování nových přechodů pro chodce, nové vodorovné a dopravní značení.	Gardenline, EUROVIA CS, a.s., Praha, SATHEA VISION s.r.o., Praha	3 396 730
51	E.Krásnohorské - chodník etapa I úsek Lipská - Kosmova	V rámci akce došlo k napojení a rekonstrukci chodníku I. Etapy úsek ulice E. Krásnohorské a ulice Kmochova. Součástí díla bylo zpracování PD a geometrickému zaměření.	WORLD INVEST v.o.s., Jirkov, Michal Kobližek - PROKA s.r.o., Strupčice	2 743 333
52	E.Krásnohorské - chodník etapa I úsek Kmochova-hřbitov	V rámci investiční akce došlo k rekonstrukci stávajícího a vybudování nového chodníku v úseku ulice E. Krásnohorské - Kmochova. Součástí akce bylo i vybudování nového veřejného osvětlení a geometrickému zaměření včetně zpracování PD.	WORLD INVEST v.o.s., Jirkov, Michal Kobližek - PROKA s.r.o., Strupčice, ELPRO Chomutov, GEOKART	2 270 956
53	Bezručovo údolí - rekonstrukce lávky č.3	V rámci investiční akce dojde k obnově mostu č.3 v Bezručově údolí včetně zpracování PD a plánu BOZP.	L. A. Interiér s.r.o., Chomutov, SINNET EU, L.A. Interiér	495 016
54	Odvodnění křižovatky ulic Kosmova a E. Krásnohorské	V rámci investiční akce došlo k úpravě povrchů a odvodnění křižovatky ulic Kosmova a E. Krásnohorské	WORLD INVEST v.o.s., Jirkov	410 470
55	ZŠ Kadaňská - rekonstrukce chodníku	Investiční akci byl vybudován nový chodník u základní školy na Kadaňské, v rámci akce byla zhotovena i projektová dokumentace.	WORLD INVEST v.o.s., Jirkov, Pavel Zeman Kadaň	415 373
56	Reko chodníků ul. Na Příhonu - úsek Kadaňská Komenského	Investiční akce kompletně řešila obnovu povrchů chodníků v úseku Komenského - Kadaňská včetně výměny veřejného osvětlení včetně zhotovení PD.	PETROM STAVBY, s.r.o., Praha, ELEKTROMONTÁŽE ŠEDIVÝ s.r.o., Chomutov, IQ PROJEKT s.r.o., Chomutov	1 369 781
57	Škroupova - rekonstrukce chodníků a VO	V rámci investiční akce došlo k celkové rekonstrukci chodníků, k obnově povrchů, výměně a částečné rekonstrukci vozovky v ulici Škroupova.	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O., Chomutov a FISAD s.r.o. Jirkov	1 624 373
58	Přechod ul. Kostnická	V rámci investiční akce došlo ke stavebním úpravám a vybudování nového bezbariérového přechodu pro chodce, k provedení vodorovného dopravního značení retroreflexním platem bílým – nový přechod pro chodce v ulici Kostnická a Dodávka, montáž a osazení přechodových svídel, stožárů včetně kabeláže veřejného osvětlení v ulici Kostnická – křižovatka s ulicí Hornická, ChomutovSoučástí akce je zpracování PD.	Václav Šedivý, Chomutov, WORLD INVEST v.o.s., Jirkov, ELPRO Chomutov, Laufer a spol. s.r.o., Chomutov	238 362
59	Nové autobusové zastávky	Nové autobusové zastávky byly pořízeny na Zahradní - přístřešku Aureo, typ AE410a-SS, 5,5 x 1,7 m, zastřešení kaleným bezpečnostním sklem, zadní a boční stěny kalené bezpečnostní sklo, bez CLV, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	mmcté1 a.s., FAEN s.r.o. CV	351 000
60	Reko chodníku Křížkova	Investiční akce je zaměřena na obnovu povrchů stávajících chodníků a veřejného osvětlení v ulici Křížkova v Chomutově. Součástí akce je zpracování PD, zeměpisné zaměření a vybudování uličních vpustí, včetně úpravy zeleně.	FREIBAU s.r.o., Praha, IQ PROJEKT s.r.o., Chomutov, Milan Luňák	819 763
61	Odvodnění ulice Blatenská	V rámci investiční akce došlo k úpravě povrchů a odvodnění ulice Blatenská, zřízení provizorní zpevněné plochy pro nájezd autobusů v rámci investiční akce „Odvodnění komunikace v ulici směrem k ul. Jabloňová, Chomutov – z lesní cesty a z ulice Pod Leselem	Stavmax - Bezděk s.r.o., Klášterec N/O	708 430
62	Alešova - doplnění chodníků v okolí autobusové zastávky	V rámci investiční akce došlo k rekonstrukci chodníku v ul. Alešova a veřejného osvětlení.	BAGROS s.r.o., Praha, ELEKTROMONTÁŽE ŠEDIVÝ s.r.o., Chomutov	991 310
63	Kamený vrch - chodník mezi svahem a domem č.p. 5279-80-81	Na Kameném vrchu došlo k odvodnění a k rekonstrukci chodníku v celkové délce 55 m a šířce 2m, nový povrch chodníku ze zámkové dlažby, součástí akce je i vybudování opěrné zdičky z palisád v délce 20,8 m.	FISAD s.r.o., Jirkov	577 006
64	17.listopadu - reko chodníků a odvodnění za bloky 47-89-92	V ulici 17.listopadu v rámci rekonstrukce chodníků došlo k odvodnění a úpravě povrchů.	BAGROS s.r.o., Praha	739 866
65	Reko chodníků a VO sídliště Jitřenka	V rámci investiční akce došlo k vybudování nových chodníků v ulici Zengerova, k výstavbě nového veřejného osvětlení na sídlišti Jitřenka.	PETROM STAVBY, s.r.o., Praha, ELEKTROMONTÁŽE ŠEDIVÝ s.r.o., Chomutov	3 230 458
66	Bezbariérové přístupy Kyjická	V ulici Kyjická došlo ke zřízení bezbariérových přístupů na chodníky.	RRR spol. s.r.o., Chomutov	206 274
67	Kamená reko chodníků v okolí č.p. 5101	V rámci investiční akce došlo k rekonstrukci chodníků v ulici Kamená u čísla popisného 5100 - 5101	PETROM STAVBY, s.r.o., Praha	1 148 066
68	Kosmonautů - reko vozovky (úsek Sluneční Alfonze Muchy)	V rámci investiční akce byla zrekonstruována komunikace, byly provedeny kompletní stavební práce, akce bude dokončena v roce 2018. Součástí akce je i zpracování projektové dokumentace.	FRK s.r.o., Kadaň, Pavel Zeman, Kadaň	657 114
<b>Investiční akce z Fondu rozvoje dopravní infrastruktury</b>				
69	Parkování - Kamený vrch	V rámci akce došlo prozatím ke zpracování projektové dokumentace Novostavba parkoviště - Kamený Vrch, Chomutov, dokumentace bude zhotovena v roce 2018	SINGS projekční atelier, s.r.o., Chomutov	275 336
70	Parkování - Klicperova ul.	V rámci investiční akce došlo k vybudování parkoviště v ulici Klicperova, k vybudování nového chodníku a veřejného osvětlení. Součástí stavby je i geometrické zaměření a zajištění koordinace BOZP.	PETROM STAVBY, s.r.o., Praha	2 285 401
71	Pořízení parkovacích automatů	V ulici Blatenské ulici byly pořízeny dva parkovací automaty včetně vytvoření plochy pro umístění parkomátů TicketLine PSA-7	WSA doprava a parkování, Praha	345 906



## 7.) Závěr

Investiční akce realizované v roce 2017 lze hodnotit v kvalitě provedení jako dobré. Nevznikly žádné výrazné problémy při realizaci, průběžné realizační problémy jsou řešeny souběžně s akcí. Akce jsou řešeny průběžně v závislosti na přípravě (PD, VŘ), podmínkách určující samotnou realizaci (povolení) a dokončení akcí (vliv klimatických podmínek aj.). V níže uvedené dokladové části jsou podrobněji uvedena data z konečného čerpání jednotlivých akcí ORI.

## 8.) Dokladová část

Příloha č. 1 - Seznam a finanční rámec investičních akcí a oprav 2017

org.j.	odd §	projekt	Výdaje	RS v Kč	RU v Kč	Čerpání v Kč	RS/Č %	RU/Č %
03	2212	1503	Reko komunikace ul. Šafaříkova a okolí	14 500 000,00	16 000 000,00	15 603 009,00	107,00	97,00
03	2212	1508	Reko komunikace a chodníku ul. Čelakovského	9 500 000,00	9 800 000,00	8 454 030,06	88,99	86,27
03	3631	1511	Veřejné osvětlení města	6 400 000,00	6 400 000,00	3 302 234,41	51,60	51,60
03	2212	1514	Reko uličních vpustí a reko povrchů komunikací - koordinace se správci sítí	3 000 000,00	3 750 000,00	2 488 645,08	82,95	66,36
03	2212	1603	Propojení ul. Na Průhonu do ul. Čermákova	3 500 000,00	3 740 000,00	3 647 678,49	104,22	97,53
03	2219	1604	Reko chodníků ul. Palackého - Riegrova	2 500 000,00	2 500 000,00	1 603 218,00	64,13	64,13
03	2219	1614	Cyklooprava	1 500 000,00	1 500 000,00	713 184,99	47,55	47,55
03	2212	1615	Komunikace a chodníky nám. T.G.Masaryka	3 500 000,00	3 500 000,00	3 396 729,94	97,05	97,05
03	3429	1622	Dětské hřiště	1 000 000,00	1 000 000,00	941 844,79	94,18	94,18
03	3639	1623	Mobilní město	1 000 000,00	1 000 000,00	433 500,00	43,35	43,35
03	3639	1624	Budovy a majetek SMCH	3 500 000,00	4 575 000,00	4 384 138,05	125,26	95,83
03	3412	1626	Kamencové jezero	39 450 000,00	59 450 000,00	38 191 672,99	96,81	64,24
03	3392	1630	Kulíšna divadlo - investice (elektroinstalace, odhlučnění, WC)	2 500 000,00	2 500 000,00	1 287 761,86	51,51	51,51
03	3412	1633	Letní kino - rekonstrukce WC	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
03	3322	2550	Obnova historických památek	5 080 000,00	640 000,00	229 813,70	4,52	35,91
03	3639	3903	Příprava projektů	11 300 000,00	11 305 000,00	6 479 741,02	57,34	57,32
03	2212	31707	Ostatní akce FRMK	1 090 000,00	389 000,00	164 709,00	15,11	42,34
03	2219	31707	Ostatní akce FRMK	34 000 000,00	5 898 000,00	2 720 683,70	8,00	46,13
03	3639	31712	Participativní rozpočet	5 000 000,00	5 000 000,00	1 525 842,19	30,52	30,52
03	3639	31713	ZŠ Hornická	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
03	3639	31714	Budova hlavního hřbitova - bezbarierový přístup	250 000,00	500 000,00	10 500,00	4,20	2,10
03	3113	31715	ZŠ Březenecká	1 500 000,00	2 900 000,00	2 667 389,97	177,83	91,98
03	3113	31716	ZŠ Hornická	3 500 000,00	3 500 000,00	3 453 902,97	98,68	98,68
03	3113	31717	ZŠ Heyrovského - investice (fasáda)	6 655 000,00	6 655 000,00	6 115 054,78	91,89	91,89
03	3113	31718	ZUS - investice (rozšíření výukových prostor, zateplení konc. Sálu)	1 050 000,00	1 292 000,00	1 291 172,00	122,97	99,94
03	3113	31719	ZŠ Na Příkopě - investice (fasáda, dveře)	6 600 000,00	4 300 000,00	4 122 751,23	62,47	95,88
03	3113	31720	ZŠ Zahradní - investice (šatny, paníkové dveře)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 298 433,08	99,88	99,88
03	3111	31721	Mateřské školy - investice (hřiště, tabule)	1 530 000,00	1 630 000,00	1 629 135,73	106,48	99,95
03	3233	31722	DDM - investice (reko hřiště)	1 000 000,00	2 400 000,00	2 398 777,66	239,88	99,95
03	3113	31723	Reko školní jídelna Kadaňská	0,00	7 500 000,00	7 494 914,15	#####	99,93
03	2219	31724	E. Krásnohorské - chodník etapa I úsek Lipská - Kosmova	0,00	2 700 000,00	2 270 955,98	#####	84,11
03	2219	31725	E. Krásnohorské - chodník etapa I úsek Kmochova-hřbitov	0,00	2 750 000,00	2 743 332,77	#####	99,76
03	2219	31726	FRDI Parkování Klicperova ul.	0,00	3 200 000,00	2 285 400,56	#####	71,42
03	3639	31728	demolice hotelu u KJ	0,00	3 356 000,00	3 044 461,28	#####	90,72
03	6171	31729	Otevřené a moderní úřady	0,00	1 775 000,00	1 066 915,00	#####	60,11
03	3412	31730	Výměna osvětlení nad ledovou plochou THŠB	0,00	1 000 000,00	0,00	#####	0,00
03	3412	31731	Přístřešky pro kontejnery venkovní plocha ZS	0,00	240 000,00	238 432,92	#####	99,35
03	2219	31732	FRDI Pořízení parkovacích automatů	0,00	380 000,00	345 906,00	#####	91,03
03	3322	31733	Vinohradská kaple	0,00	320 000,00	307 768,90	#####	96,18
03	3322	31734	Dům č.p. 38-Mánesova (zadní vchod ČVUT)	0,00	380 000,00	372 652,17	#####	98,07
03	3322	31735	Radnice - izolace vnitřního dvorečku	0,00	470 000,00	433 893,90	#####	92,32
03	3322	31736	Dům č.p.104 - husovo náměstí (stavební úřad)	0,00	550 000,00	518 729,42	#####	94,31
03	3322	31737	Oprava fasády - oblastní muzeum	0,00	1 150 000,00	1 141 691,47	#####	99,28
03	3322	31738	Socha svaté Barbory	0,00	340 000,00	332 765,68	#####	97,87
03	3322	31739	Výklenková kaple - Zadní Vinohrady	0,00	330 000,00	327 000,00	#####	99,09
03	2219	31740	Zastávka Zahradní I - nový přístřešek	0,00	200 000,00	0,00	#####	0,00
03	2219	31741	Rekonstrukce lávky č.3	0,00	496 000,00	495 015,50	#####	99,80
03	2212	31742	Odvodnění křižovatky ulic Kosmova a E. Krásnohorské	0,00	461 000,00	410 469,51	#####	89,04
03	2219	31743	Reko chodníku Kadaňská	0,00	437 000,00	415 373,17	#####	95,05
03	2219	31744	Reko chodníku ul. Na Průhonu - úsek Kadaňská Komenského	0,00	1 500 000,00	1 369 781,01	#####	91,32
03	2219	31745	Škroupova - rekonstrukce chodníků a VO	0,00	1 700 000,00	1 624 372,61	#####	95,55
03	2212	31746	Přechod ul. Kostnická	0,00	240 000,00	232 311,76	#####	96,80
03	6171	31747	Prostupné zaměstnávání	0,00	1 999 000,00	336 979,29	#####	16,86
03	2219	31748	Nové autobusové zastávky	0,00	300 000,00	299 999,50	#####	100,00
03	2219	31749	Rekonstrukce chodníku Křížkova	0,00	2 200 000,00	819 762,71	#####	37,26
03	2212	31750	Odvodnění ulice Blatenská	0,00	800 000,00	708 430,00	#####	88,55
03	3612	31751	Sociální bydlení Palachova	0,00	5 510 000,00	268 530,00	#####	4,87
03	2219	31752	Alešova doplnění chodníků v okolí autobusové zastávky	0,00	1 177 000,00	991 310,00	#####	84,22
03	2219	31753	Kamenný Vrch - chodník mezi svah a domem č.p. 5279-81	0,00	681 000,00	577 006,18	#####	84,73
03	2219	31754	17.listopadu-reko chod. Za bloky 47-89-92	0,00	831 000,00	739 865,72	#####	89,03
03	2219	31755	Reko chodníků a VO - sídliště Jitřka	0,00	3 449 000,00	3 230 458,38	#####	93,66
03	2219	31756	Bezbarierové přístupy Kyjická	0,00	306 000,00	206 273,90	#####	67,41
03	2219	31757	Kamenná reko chodníků v okolí č.p. 5101	0,00	1 251 000,00	1 148 066,00	#####	91,77
03	2219	31758	Školní pěšina - nový chodník	0,00	225 000,00	0,00	#####	0,00
03	2212	31759	Kosmonautů - reko vozovky Sluneční - A. Muchy	0,00	3 749 000,00	657 113,33	#####	17,53
03	3322	31760	Výměna oken - budova TSCHM	0,00	1 600 000,00	663 274,00	#####	41,45

Příloha č. 2 – Fotografie – participativní rozpočet  
PB – Oprava psího útulku



PB – Bezručovo údolí – lesní cestou na I. mlýn bezpečně





PB – Upravení okolí fontány v parku



PB – spojka cyklostezky a cyklotrasy mezi Bandou a Kamencovým jezerem





PB –Rekonstrukce obvodové zdi hřbitova v Beethovenově ulici



PB – Bike areál - dokončovací práce



PB- Zábradlí pro bezpečí dětí na lávce přes přivaděč v Děvínské ulici



PB – Úprava sjezdu na cyklotrasu v Přemyslově ulici (dolní brána PZOO)





# Souhrnné vyhodnocení projektů 2017

## Odbor rozvoje investic

### Úsek dotací a strategie rozvoje města

**Statutární město Chomutov čerpá finančních prostředků z těchto zdrojů:**

- ESF (Evropský strukturální fond)
- OPŽP – operační program Životní prostředí
- OPVVK – Operační program vývoj, vzdělávání, konkurenceschopnost
- MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
- MK ČR – Ministerstvo kultury
- MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
- IROP – Integrovaný regionální operační program
- Interreg V/A
- OPZ – Operační program zaměstnanost
- SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

Rok 2017 byl stěžejním rokem přípravy nových investičních i neinvestičních projektů z nových zdrojů. Statutární město Chomutov v tomto období připravovalo značné množství projektů v rámci přeshraniční spolupráce do operačního programu Interreg V/A, dále do OPVVK (Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání), Integrovaný regionální operační program, program Ministerstva práce a sociálních věcí, do OPZ – operačního programu zaměstnanost.

V období příprav projektů, náklady související s přípravou projektů hradí město, projekty jsou v průběhu roku registrovány a po jejich případném schválení dojde k samotné realizaci projektů a plnění harmonogramu, včetně finančního plánu získaných dotací. V níže uvedené tabulce je stručně uveden přehled nákladů na přípravu a realizaci projektů.

**Tabulka vyúčtování výdajů příprav a realizace projektů v roce 2017:**

projekt	Výdaje	RU v Kč	Čerpání v Kč	RU/Č %
3903	Příprava projektů	11 305 000,00	6 479 741,02	57,32
31605	OPŽP - Energetická opatření MŠ Kvítek	9 083 000,00	7 622 767,54	83,92
31606	OPŽP - Energetická opatření MŠ Kamarád	9 200 000,00	6 670 804,46	72,51
31607	Inkluzivní vzdělávání v Chomutově	7 082 000,00	5 887 422,52	83,13
31608	Interreg V/A - Muzea v Krušných horách - tradice, budoucnost	3 000 000,00	3 011,00	0,10
31701	Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina A	14 160 000,00	13 716 660,20	96,87
31703	Digitální, jazykové, přírodní a řemeslné kompetence v oborech na ZŠ	2 000 000,00	1 480 798,00	74,04
31727	Sociální centrum B	9 340 000,00	9 233 563,94	98,86
31728	demolice hotelu u KJ	3 356 000,00	3 044 461,28	90,72
31729	Otevřené a moderní úřady	1 775 000,00	1 066 915,00	60,11
31747	Prostupné zaměstnávání	1 999 000,00	336 979,29	16,86
31751	Sociální bydlení Palachova	5 510 000,00	268 530,00	4,87
31838	Komunitní plán	1 035 000,00	220 883,00	21,34

V níže uvedené tabulce uskutečněných projektů jsou stručně popsány všechny projekty, které byly v roce 2017 ve fázi přípravy, nebo přímo realizovány. Také jsou zde uvedeny projekty, které byly dokončeny a proplaceny z části, nebo úplně. U jedno-etapových projektů zpravidla dochází k posunu plateb do dalšího období, vždy záleží na době realizace projektu a jeho ukončení a podání žádosti o platbu.



Celkový příjem z dotačních prostředků za rok 2017 dosáhl částky 19.422.276,- Kč. Tyto příjmy zahrnují i doplatky projektů z minulých období i z projektů zrealizovaných v roce 2016 a z části, nebo zcela proplacených v roce 2017, převážně se jedná o více-etapové projekty, jejichž realizace se koná i několik let.

**Přehled uskutečněných projektů v roce 2017** je uveden stručně v souhrnné tabulce.

2017							
název projektu	popis projektu	náklady 2017 vice-etapové projekty v Kč	náklady jednoetapo vé projekty 2017	celkové náklady projektu v Kč	Dotace rok 2017 v Kč	Předpoklad celkové dotace	vlastní zdroje rok 2017 v Kč
OPVVK - Inkluzivní vzdělávání v Chomutově	Záměrem projektu je realizace aktivit zaměřených na podporu inkluze v oblasti předškolního vzdělávání a na podporu realizace pronikluzivních opatření. Cílem je zkvalitnění vzdělávání dětí a žáků v běžných školách. Dotaci získá město až v roce 2017.	5 887 423	0	28 932 262,00	14 427 417	28 932 262	0
OPŽP - Zateplení MŠ Kvítek, Písečná 5072, 430 04 Chomutov	Projektem budou provedena úsporná energetických opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Kvítek na Písečné. V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy, zateplení obvodového pláště budovy kontaktním zateplovacím systémem, dojde k zazdění proskleného schodiště a současně bude zateplena střecha. Dále budou vyměněny veškeré okenní výplně + otvory nacházející se na obvodovém plášti objektu, za výplně z plastových profilů a zasklení izolační trojskly (stávající dřevěná okna, původní meziokenní izolační vložky apod.) a v části, kde bude zazděno prosklené schodiště budou instalovány nová 3 okna. Upraven bude také přístřešek u vstupu. Součástí provedených energetických opatření vedoucích ke zlepšení vnitřního prostředí je provedení nuceného větrání s rekuperací tepla u místnosti s pobytem dětí. Současně dojde k instalaci subregulace tepla na vstup CZT do objektu a bude zaveden systém energetického managementu s cílem odebrat tolik tepla, aby nedocházelo k přetápění interiéru, tedy k neefektivnímu provozu.	9 084 000	0	9 083 674	0	2 537 609	9 084 000
OPŽP - Zateplení MŠ Kamarád, Růžová 5255, 430 04 Chomutov	Realizací budou provedena úsporná energetických opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy na adrese Růžová 5255, 430 04 Chomutov. Projektem jsou řešeny stavební úpravy - zateplení pavilónu areálu mateřské školy- v rámci kterých dojde k zateplení obvodových plášťů komplexu budov kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střech. Dále budou vyměněny veškeré nevyměněné výplně + otvorů nacházející se na obvodovém plášti objektu za výplně z plastových profilů a zasklení izolačními dvojskly (stávající dřevěná okna, původní meziokenní izolační vložky apod.). Součástí provedených energetických opatření vedoucích ke zlepšení vnitřního prostředí je provedení nuceného větrání s rekuperací tepla u místnosti s pobytem dětí. Současně dojde k instalaci subregulace tepla na vstup CZT do objektu a bude zaveden systém energetického managementu s cílem odebrat tolik tepla, aby nedocházelo k přetápění interiéru, tedy k neefektivnímu provozu. Objekt je po celou dobu (j v posledních třech letech ) využíván pro účely MŠ.	9 200 000	0	16 066 745	0	4 795 061	9 200 000
MMR - Demolice Hotelu u jezera	Jedná se o neinvestiční dotaci ze Státního rozpočtu Ministerstva pro Místní rozvoj na akci Demolice hotelu u Kamencového jezera. V rámci akce dojde k demolici hotelu u Kamencového jezera	3 040 000	0	3 353 000	1 713 597	407 577	1 326 403
OPZ - Prostupné zaměstnávání	Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory znevýhodněných osob s kumulací hendikepů k tomu, aby se mohly uplatnit na trhu práce. Prostřednictvím souboru aktivit projektu budou účastníci projektu podpořeni ke vstupu na trh práce a tím dojde ke zlepšení jejich sociální životní situace. Pod organizační složkou města s názvem Pracovní skupina budou vytvořena nová pracovní místa pro znevýhodněné osoby, které budou soustavně podporovány prostřednictvím podpůrných aktivit projektu.	336 979	0	9 992 875	1 898 660	9 493 231	0
OPZ - Tvorba Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 - 2021	Cílem projektu je vytvoření nového komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb pro území obce s rozšířenou působností Chomutov na období 2018 - 2021. V první fázi dojde k vyhodnocení stávajícího komunitního plánu na období 2014 - 2017, následně bude s vybranými pracovními skupinami proveden monitoring současného stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb s analýzou, které služby na území ORP Chomutov chybí a které je žádoucí v následujících čtyřech letech podpořit.	220 883	0	2 068 637	982 603	1 965 205	0
IROP - Digitální jazykové, přírodní a řemeslné kompetence v oborech na ZŠ	V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám učeben několika Základních škol, k vybavení učeben nábytkem a IT technikou. Předložený projekt řeší problémy současného stavu odborných učeben v Základních školách v Chomutově. Předně projekt řeší problém nedostatečného vybavení základních škol pomůckami podporujícími klíčové kompetence jako cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory či práce s digitálními technologiemi. Projekt řeší omezující podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Dalším problémem, který budeme v projektu řešit, že většina z škol není bezbariérová, nebo jen velmi omezeně. Tato skutečnost je pro žáky se SVP velmi limitující. Z tohoto důvodu bude v rámci projektu řešena i bezbariérovost základních škol dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Z hlediska klíčových kompetencí, které vyžadují využití moderních ICT technologií a s nimi související připojení k internetu, je další řešenou oblastí projektu právě konektivita a zajištění internetu v dotčených základních školách. Odpovídající technické zázemí v základních školách chybí nebo neodpovídá požadavkům a trendům moderní společnosti. V současné době jsou přitom žáci zvyklí běžně využívat internet a jeho možnosti i pro školní účely. Nicméně jeho využívání v rámci školní výuky velmi zůstává. Projektem dojde ke zlepšení technického stavu a vybavenosti budov a odborných učeben v osmi ZŠ tak, aby odpovídaly aktuálním standardům a požadavkům pro rozvoj základního vzdělávání.	1 480 798	0	98 996 315	0	84 146 868	1 480 798
Interreg V/A - Otevřené a moderní úřady	Projekt je věcně zaměřen na zvýšení aktivní spolupráce měst Chomutov a Annaberg-Buchholz. V rámci partnerství mezi městy Annaberg-Buchholz a Chomutov budou rozvíjeny kontakty mezi pracovníky obou z magistrátů, konkrétně mezi pracovníky odborů, které mají v péci komunikaci s veřejností, plánování a řízení projektů, agendu e-governmentu a školství. Jde o neinvestiční projekt zaměřený na pracovní stáže pracovníků v partnerském městě/organizaci, realizaci odborných workshopů a posílení jazykových kompetencí pracovníků obou úřadů. Aktivita: • Zlepšení jazykových kompetencí – 12 osob za SMCH, • Hospitační pobyty – 10 osob v Annabergu pro českou stranu + 10 osob, v Chomutově pro německou stranu, • Odborné workshopy – 10 x v Chomutově + 10 x v Annabergu, • Nová místnost pro telekonference vč. stavebních prací (z rozpočtu), vybavení nábytkem a multimediálními technikou, osvětlením (z dotace)	1 066 915	0	5 985 200	0	3 387 420	1 066 915
MK - Oprava fasády Oblasni muzeum	Projekt je zaměřen na obnovu historické památky oblastního muzea - jezuitské koleje s kostelem a gymnáziem v městské památkové zóně v CV	0	1 141 691	1 141 691	400 000	0	741 691
IROP - Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina - akce A	Za účelem zvýšení nedostatečné kapacity stávajícího zařízení pro děti do tří let v Chomutově bude provedena rekonstrukce objektu, ve kterém bude poskytována služba péče o děti v dětské skupině ve věku od 1 do 3 let. Cílem rekonstrukce je úprava městského objektu pro potřeby organizace zřízené městem. Sociální služby Chomutov, která bude provozovatelem služby péče o dítě v dětské skupině. V objektu budou sídlit dvě dětské skupiny, jedna o kapacitě 22 dětí a druhá o kapacitě 15 dětí.	13 716 660	0	29 578 460	0	19 173 701	13 716 660
IROP - Sociální centrum - akce B	Záměrem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb odborného sociálního poradenství (OSP) v Chomutově. Rekonstrukcí budovy B objektu Kamenná 5164 a pořízení vybavení dojde k vytvoření nového zázemí pro stávající službu OSP. Budou tak vytvořeny podmínky pro její kvalitnější poskytování, zároveň díky novému zázemí bude možné navýšit stávající kapacitu služby, čímž dojde ke zvýšení dostupnosti služby pro větší počet klientů obzvláště ve vazbě na sociálně vyloučenou lokalitu.	9 233 564	0	12 861 076	0	11 297 956	9 233 564
IROP - Sociální bydlení Palachova	Cílem projektu je zajištění infrastruktury sociálního bydlení za účelem zvýšení dostupnosti kvalitního bydlení pro osoby a domácnosti v nevhodných bytových podmínkách nebo bez domova. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle je rekonstrukce objektu (bytového domu), včetně pořízení základního vybavení do bytových jednotek, v ul. Palachova č.p. 3416 v Chomutově, který bude sloužit pro účely sociálního	268 530,00	0,00	6 262 882,00	0,00	5 636 593,00	268 530,00
				19 422 276			

Projekty, jejich příprava a realizace, monitoring a udržitelnost je časově a finančně náročná, řízení projektů nejen z EU zaštiťuje úsek dotací a strategického plánování na Odboru investic města. Po ukončení fyzické realizace projektu a jeho vyúčtování, je vždy vypracována závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu. U projektů, které jsou složeny z více etap, jsou zprávy a žádosti o platbu zpracovávány průběžně, zpravidla po šesti měsících realizace projektu. U jedno-etapových projektů, je závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu vyhotovena po skončení fyzické realizace projektu.

Po skončení fyzické realizace a administrace projektu včetně vyrovnaní všech finančních závazků, začíná u určitých typů projektů povinná **tzv. udržitelnost**. Jedná se zpravidla o tzv. tvrdé projekty, investiční projekty podporující rekonstrukce, výstavby, vybavení a zhodnocení majetku. V monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu (MZUP) jsou jednou za rok monitorovány cíle, výsledky a indikátory projektu, tato doba zpravidla bývá 5 – 10 let, vždy podle podmínek poskytovatele dotace.

V roce 2017 dobíhaly jednotlivé projekty, hrazené převážně z rozpočtu města a to z důvodu ukončení období Integrovaného operačního programu **IOP "Sídliště, místo pro život"**, v roce 2016 u těchto projektů z větší části probíhala pěstební péče. V návaznosti na projekt Revitalizace okolí KASS I. Etapa, který byl hrazen z dotačních zdrojů, navazoval projekt Revitalizace okolí KASS na sídlišti Zahradní, CV-II. Etapa-demolice, kde v rámci projektu došlo k oddělení stávající budovy na dvě části. Nově pak navazoval a začal být realizován projekt s názvem Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na Zahradní, Chomutov - II. ETAPA. Oba tyto projekty byly a jsou hrazeny z rozpočtu města, dokončení proběhlo do konce roku 2017. V následujícím roce dobíhá udržitelnost pěstební péče revitalizovaného projektu.

Vzhledem k rozsáhlému území staveniště byla výstavba naplánována celkem ve dvou etapách a druhá etapa byla ještě rozdělena na dvě části (1. + 2.). První etapa projektu KASS I. Etapa se začala realizovat v na zač. roku 2015 a ukončena byla na konci listopadu 2015. První část II. Etapy projektu KASS II. etapa 1. A + 1B se začala realizovat v roce 2015 a dokončena bude 30. 5. 2017. Druhá část II. etapy = KASS III. proběhne v roce 2017 (uznatelné výdaje) a následně bude dokončena v roce 2018 okružní křižovatka mezi ulicemi Zahradní a Písečná.

Druhá etapa revitalizace okolí kulturního střediska KASS. část 1. A. rekonstruovala místní komunikaci Písečná, modernizovala obě zastávky MHD, přičemž zastávku ve směru do města byla přesunuta před budovu kulturního střediska KASS. V rámci KASS II. část 1. B bylo budováno nové veřejné prostranství na místě zbourané části objektu KASS a zcela nové propojení s komunikací Písečná. Cílem komplexní revitalizace na sídlišti Zahradní je odstranění bariér a nevyužívaných součástí veřejného prostoru, zajištění přirozeného bezbariérového průchodu hlavních komunikačních tahů skrze řešenou lokalitu, bezbariérové zpřístupnění objektu KASS a řešení parkování v území.

Revitalizace kulturního střediska KASS, jeho čtvrtá část stavebních úprav se nachází ve fázi příprav, je rozdělena do čtyř částí revitalizace okolí. První dvě části budou plně hrazeny z rozpočtu města, jedná se o revitalizaci parkoviště a parku u KASSu, kde dojde k úpravě parkoviště, VO, chodníků, cest a zeleně.

Třetí a čtvrtá část revitalizace území zahrnuje dvě křižovatky, jedna hned vedle kulturního střediska a druhá u Tesca, obě křižovatky budou revitalizovány včetně chodníků a VO. V případě úspěchu SMCH získá dotaci ze **SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury)**, projekt je ve fázi příprav.

V rámci **SFDI** město zahájilo přípravu žádostí o dotaci u těchto projektů:

- **Lipská – Mýtná cyklochodník** – celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 4.270.000,- Kč z toho podpora ze SFDI 1.945.000,- Kč
- **Podchody** – podchod pod silnicí č. 13 na Písečné a podchod u PZOO, předpokládané náklady projektu jsou 8.500.000,- Kč, v případě získání dotace je podpora ve výši 7.500.00,- Kč
- **Lávka k nádraží nad silnicí** - předpokládané náklady projektu jsou cca 12.000.000,- Kč, v případě získání dotace je podpora ve výši cca 11.000.00,- Kč

**V rámci Operačního programu vědy, výzkum, vzdělávání, konkurenceschopnost (OPVVK)** úsek dotací realizuje druhým rokem projekt s názvem **Inkluzivní vzdělávání v Chomutově**. Tento projekt je podpořen z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jeho celkové náklady zhruba dosahují výše 29. mil. korun českých. Do projektu je zapojeny čtyři základní školy, jedna mateřská škola a nezisková organizace Člověk v tísni. Jedná se o více - etapový projekt, realizace projektu je stanovena od 1. 7. 2016 do 31. 6. 2019. Záměrem projektu je realizace aktivit na podporu inkluze v oblasti předškolního vzdělávání a na podporu realizace proinkluzivních opatření. Specifickým cílem je zkvalitnění vzdělávání zejména v sociálně vyloučených lokalitách a řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu.

V rámci **Operačního programu zaměstnanost (OPZ)** byly podány žádosti na projekty:

- Prostupné zaměstnávání v Chomutově - projekt schválen, realizace 2017-2020
- Tvorba Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 – 2021 - projekt schválen, realizace 2017-2018
- Chytrý Chomutov - projekt schválen, realizace 2018 -2020

Dále došlo v roce 2017 k přípravě projektů v rámci podpor Program spolupráce Sasko a ČR:

- Muzeum v Krušných horách - tradice a budoucnost
- Otevřené a moderní úřady

V roce 2017 stále probíhala příprava projektu s názvem **Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov – Písečná – domov pro osoby se zdravotním postižením - modernizace**. Projekt se nachází ve fázi schvalovacího procesu, bude podpořen z programu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Projekty v rámci Integrovaného operačního programu (**IROP**):

- **Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 dětské skupiny v Chomutově - A** příprava a realizace projektu přechází z roku 2017, dokončení proběhne v dubnu 2018.
- **Sociální centrum Kamenná - B** příprava a realizace projektu přechází z roku 2017, dokončení proběhne v dubnu 2018.








- **Sociální bydlení Palachova** – v roce 2017 probíhala příprava projektu, byla podána žádost o dotaci, v případě úspěchu získání dotace bude probíhat realizace v roce 2018.
- **Infrastruktura volnočasových zařízení - výzva č. 57** – na konci roku došlo k přípravné fázi projektu, který je zaměřený na čtyři učebny tří v DDM a jednu v Lidové škole umění – stavba, konektivita, vybavení.
- **Digitální, jazykové, přírodní a řemeslné kompetence v oborech na ZŠ** - v roce 2017 probíhala příprava projektu, byla podána žádost o dotaci, realizace projektu bude probíhat v roce 2018-2019.

V rámci programu **OPŽP** proběhla příprava a realizace těchto projektů:

- **Energetická opatření MŠ Kvítek** - příprava a realizace projektu probíhala v roce 2017, dokončení projektu proběhne v srpnu 2018, do konce roku 2018 by město mělo obdržet dotaci 30% z celkových způsobilých výdajů projektu.
- **Energetická opatření MŠ Kamarád** - příprava a realizace projektu probíhala v roce 2017, dokončení projektu proběhne v srpnu 2018, do konce roku 2018 by město mělo obdržet dotaci 30% z celkových způsobilých výdajů projektu.

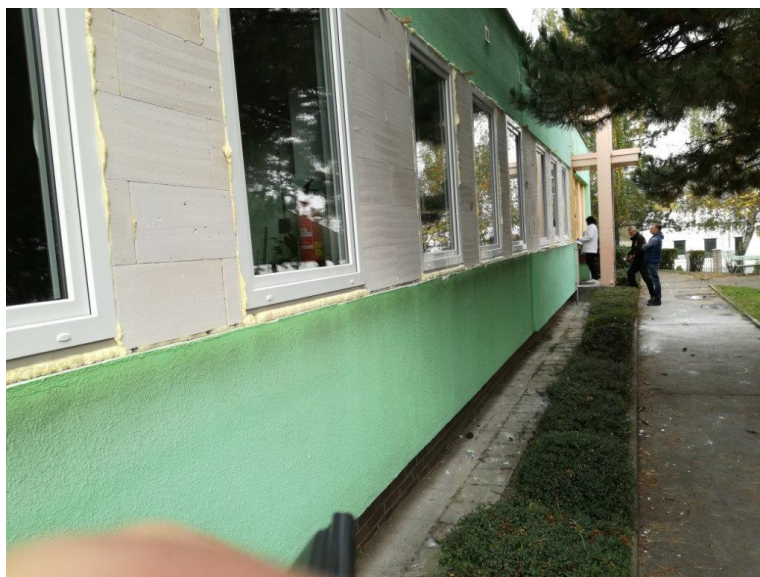



- **Energetická opatření ZŠ Kadaňská** – projekt se nachází v přípravné fázi, dotace schválena na konci roku 2017, realizace projektu rok 2018 – květen 2019.
- **Energetická opatření správní budova Městské lesy Hora svatého Šebestiána** - projekt se nachází v přípravné fázi, předpoklad schválení dotace v průběhu roku 2018, realizace projektu rok 2018. Náklady cca 3.300.000,- Kč, dotace ve výši 45%.

Z programu **Ministerstva pro místní rozvoj** (MMR) proběhla příprava a částečná realizace projektu Demolice hotelu u jezera, dokončení projektu proběhne v roce 2018.

V rámci podpory kulturních památek získalo SMCH podporu z Ministerstva kultury ve výši 400.000,- Kč na opravu fasády Oblastního muzea v Chomutově.

Akce pracovní skupiny 2017		
1	oprava BUS zastávek - dokončení z roku 2016	2 000,00 Kč
2	oprava schodiště hřiště a družiny ZŠ Duhová cesta	12 000,00 Kč
3	oprava izolace hlavního pavilonu ZŠ Duhová cesta	3 000,00 Kč
4	oprava kanalizace ZŠ Duhová cesta	6 000,00 Kč
5	demolice garáží ul.Hálkova včetně odvozu odpadu	40 000,00 Kč
6	oprava kanalizace Filipovy rybníky -rod.dům	5 000,00 Kč
7	montáž vypouštění - Narcis II.zahradkáři	2 500,00 Kč
8	zemní práce Kamencové jezero - molo vstup	6 000,00 Kč
9	oprava podpěrných sloupů vleku areál Banda	2 500,00 Kč
10	odvoz a mazání lan na vlek Banda	1 500,00 Kč
11	výroba mezikusu na napínací stožár Banda	2 000,00 Kč
12	repace soukolí stožáru vleku Banda	1 500,00 Kč
13	navezení písku na pláž Kamencové jezero	8 000,00 Kč
14	výroba a montáž 3 ks lávky Bezručovo údolí	5 200,00 Kč
15	oprava zábradlí a montáž - přivaděč	2 500,00 Kč
16	oprava lávek po trase Bezručovo údolí	4 000,00 Kč
17	výroba a montáž 4 ks laviček městský park	4 000,00 Kč
18	oprava šachovnice městský park	1 500,00 Kč
19	oprava střechy vchodu Červený kříž	3 400,00 Kč
20	montáž kotce Městská policie	3 500,00 Kč
21	oprava brány dětské hřiště ul.Školní	2 500,00 Kč
22	oprava a montáž buňky autoškola Omega	2 800,00 Kč
23	oprava střechy víceúčelové centrum (VEROS)	4 000,00 Kč
24	oprava havárie potrubí TSMCH	5 600,00 Kč
25	oprava víka rozvaděče Autoškola Omega	2 500,00 Kč
26	oprava oplocení Letní stadion	4 000,00 Kč
27	oplechování výloh staré městské lázně	6 000,00 Kč
28	oprava sprchových koutů sport.hala Březenecká	3 000,00 Kč
29	oprava palisádového záhonu městský park	2 700,00 Kč
30	oprava nátěru fontány u budovy staré radnice	5 000,00 Kč
31	nátěry dveří stavební úřad	2 000,00 Kč
32	oprava fasády stavební úřad	10 000,00 Kč
33	oprava kanalizace dešťové stavební úřad	6 000,00 Kč
34	oprava střechy hotel Kamenný vrch	20 000,00 Kč
35	oprava kanalizace hotel Kamenný vrch,koupelna	5 600,00 Kč
36	stavební úpravy učebny suterén ZŠ Kadaňská	29 000,00 Kč
37	oprava oplocení MŠ Zahradní	5 000,00 Kč
38	oprava osvětlení v podchodu KASS	2 500,00 Kč
39	oprava ochranných sítí hřiště Zahradní	2 000,00 Kč
40	přemístění trampolíny KASS-hřiště Zahradní	1 000,00 Kč
41	zemní práce hřiště Zahradní,ukotvení trampolíny	2 500,00 Kč
42	oprava oplocení hřiště fotbal - Monika	2 500,00 Kč
43	oprava elektrorozvaděče hřiště u Moniky	3 000,00 Kč
44	oprava střechy v areálu hřiště u polikliniky	4 000,00 Kč
45	oprava splaškové kanalizace ČVÚT	6 000,00 Kč



46	výměna vchodových dveří kadeřnictví Sp.hala	5 000,00 Kč
47	oprava komína hotel Kamenný vrch	3 000,00 Kč
48	oprava opěrné zdi školy nám.T.G .Masaryka	15 000,00 Kč
49	montáž dopravního značení ul.Lipská	2 000,00 Kč
50	navezení štěrku na hřiště Domovina	6 000,00 Kč
51	oprava požárního žebříku MěPo Dřínovská	2 500,00 Kč
52	oprava splaškové kanalizace sklep Zborovská	5 000,00 Kč
53	reko kuchyňky a WC 3.patro ul.Zborovská	2 860,00 Kč
54	reko skladu a zasedačky ul. Zborovská	20 000,00 Kč
55	oprava stropu kuchyňky přízemí ul.Zborovská	1 500,00 Kč
56	oprava výdřevy a nátěr lávky kurty Povodí	3 000,00 Kč
57	oprava fasády vrátnice Zimní stadion	4 000,00 Kč
58	odvodnění Třešňovka,montáž ocelových roštů	10 000,00 Kč
59	oprava oplocení Kamencové jezero - volejbal	5 000,00 Kč
60	oprava elektroinstalace Kamen.jezero - volejbal	6 000,00 Kč
61	montáž nového oplocení areálu Měpo - zahrada	8 000,00 Kč
62	opravy v prostorách knihovny ul.Dřínovská	20 000,00 Kč
63	stěhování nábytku - havárie vody ČVUT	1 500,00 Kč
64	oprava vlajkových stožárů ZŠ Zahradní	1 500,00 Kč
65	montáž sítí na holuby sp.hala Březenecská	1 500,00 Kč
66	oprava oplocení garáže ul.El.Krásnohorské	3 000,00 Kč
67	oprava krytu kanalizace městský park	2 000,00 Kč
68	montáž a výroba 2 ks parapetů knihovny Měpo	1 500,00 Kč
69	bourání a osazení dveří a okna Letní stadion	15 000,00 Kč
70	oprava parkovacích zábran ul.Dřínovská	2 500,00 Kč
71	oprava zábradlí podchod Březenecská	1 500,00 Kč
72	oprava vstupu do krytu CO ZŠ Březenecská	1 500,00 Kč
73	malování místnosti TSMCH nám.1.máje	1 000,00 Kč
74	osazení dveří kanceláře kino Praha	1 500,00 Kč
75	oprava kanalizace MŠ Palacká,malování	20 000,00 Kč
79	oprava vrat MŠ Školní pěšina	8 000,00 Kč
77	oprava omítky MŠ Růžová	1 000,00 Kč
78	oprava kotelný autobusové nádraží	5 000,00 Kč
79	oprava střechy výtahu ČVÚT	3 200,00 Kč
80	oprava oken ZŠ Školní ul.,oprava střechy přístavby	12 000,00 Kč
81	oprava kanalizace MŠ 17.listopadu	4 100,00 Kč
82	oprava oplechování rozvaděče MŠ Blatenská	3 500,00 Kč
83	oprava chodník Mánesova ul.	3 000,00 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>467 960,00 Kč</b>

31.12.2017



Petr Bláha  
vedoucí Pracovní skupiny
